

# ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI 3. DÖNEM YATIRIM RAPORU

10 EKİM 2017

## YATIRIMCI KURULUŐ DÖNEM RAPORU

1- YATIRIM DÖNEMİ	: 2017 Yılı 3. Dönem
2- YATIRIMCI KURULUŐUN ADI	: ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
3- TOPLAM PROJE SAYISI	: 8 Adet
4- PROJELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI	
Eđitim-Yükseköđretim Sektörü	: 6 Adet
Eđitim-Beden Eđitimi ve Spor Sektörü	: 1 Adet
Eđitim-Kültür Sektörü	: -
DHK-Sosyal-Teknolojik Arařtırma Sektörü	: 1 Adet
5- TOPLAM PROJE TUTARI	: 395.872.000,00 TL
6- ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 219.856.585,84 TL
7- YIL ÖDENEĐİ TOPLAM	: 73.286.000,00
8- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 39.878.608,02 TL
9- PARASAL GERÇEKLEŐME	: % 66
10- FİZİKİ GERÇEKLEŐME	: % 60
11- BİTEN PROJE SAYISI	: -
12- DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 8 Adet
13- İHALE AŐAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -
14- BAŐLANMAYAN PROJE SAYISI	: 1
15- BAŐLANMAMA NEDENLERİ	: Diđer projelerin daha öncelikli olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiŐtir.
16- ÇÖZÜMLENMEŐİ İSTENEN SORUN VE DARBOĐAZLAR	: -
17- SORUN VE DARBOĐAZ NEDENLERİ	: -
18- ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	: -

## Üniversitemiz 2017 Yılı Bütçesi


Proje Adı	Yıl Ödeneği, TL
1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri	500.000,00
2-Kampüs Altyapısı	31.998.000,00
3-Derslik ve Merkezi Birimler	1.000.000,00
4-Merkezi Araştırma Laboratuvarı	3.314.000,00
5-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000,00
6-Muhtelif İşler	33.942.000,00
7- Yayın Alımı	1.505.000,00
8-Yükseköğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Sistem ve Süreç Tasarımı	1.025.000,00
Toplam	73.286.000,00

# 1-Çeşitli Ünitelerin Etüt-Proje İşleri

Proje No : 2017H032040

Proje Tutarı : 500.000,00 TL

PROJE BEDELİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
			NAKİT HAR.%	FİZİKİ GER.%	
500.000,00	500.000,00	67.850,00	%14	%14	Üniversitemize ait yapılması planlanan eğitim ve hizmet binaları ile diğer yapı işlerine ait projelerin hazırlanması çalışması devam etmektedir.

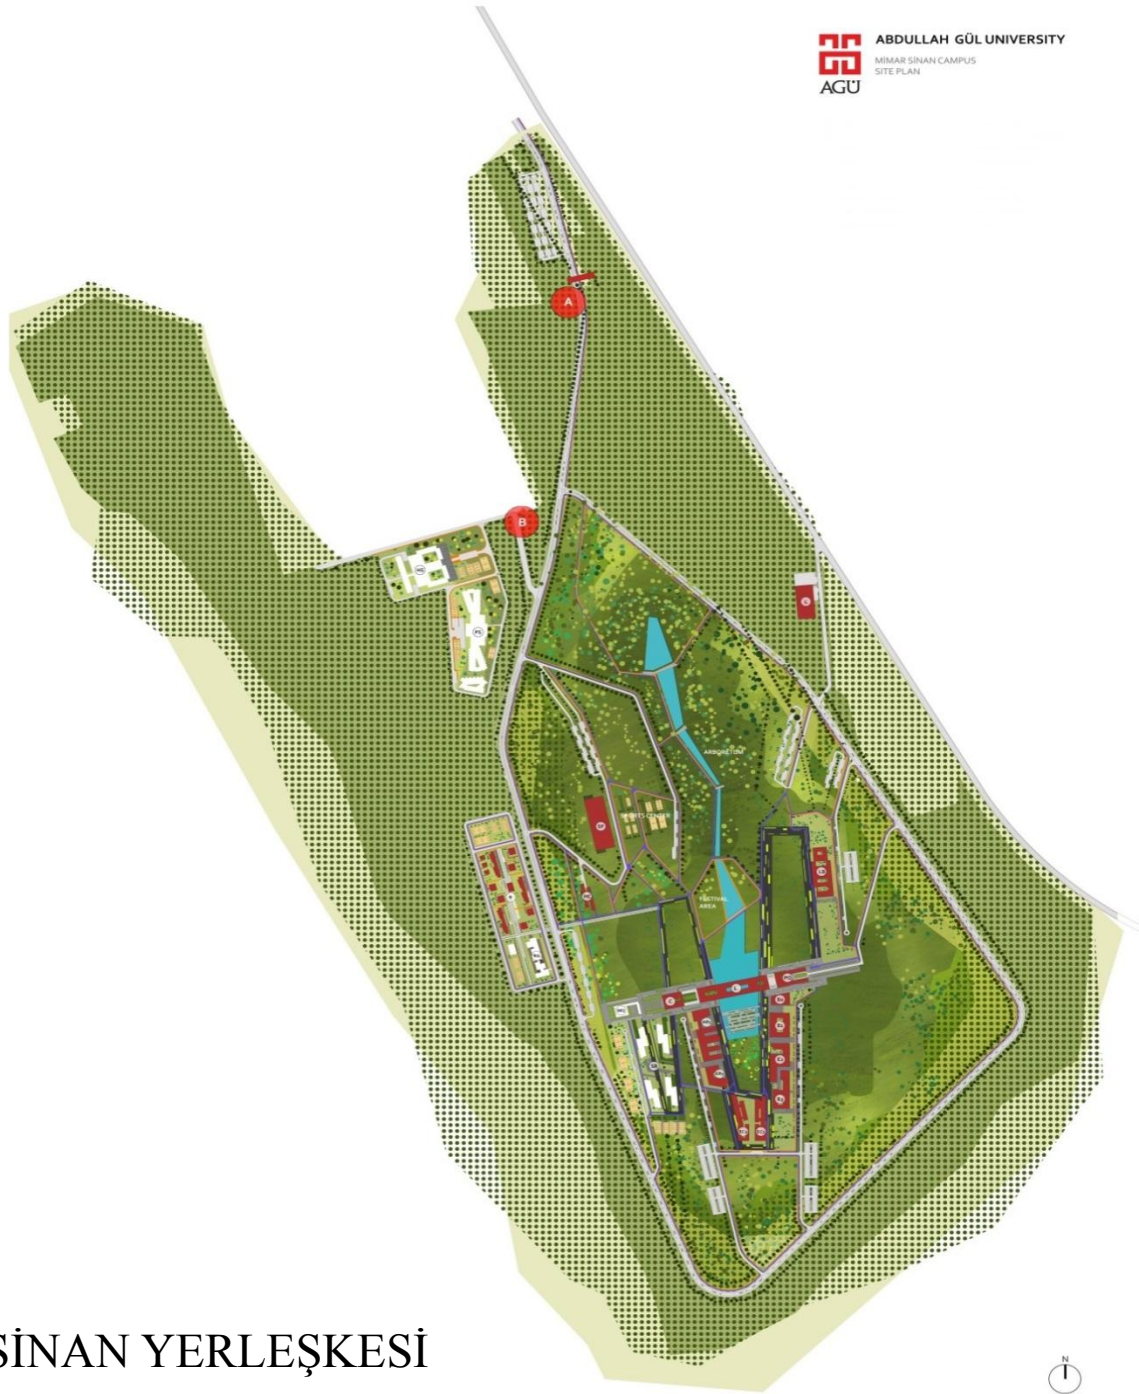

# MİMAR SİNAN YERLEŞKESİ



## 2- Kampüs Altyapısı

Proje No : 2011H037140

Proje Tutarı : 82.300.000,00 TL

PROJE BEDELİ	GEÇEN YILLAR HARCAMASI, TL	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR. %	FİZİKİ GER.%	
82.300.000,00	30.325.041,92	31.998.000,00	15.065.565,55	%47	%55	Mimar Sinan Yerleşkesi Altyapı Tesisleri İnşaatı Yapım İşi devam etmektedir.

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesinde altyapı inşaatı devam etmektedir. 2018 sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında;  
Parsel tesviye işleri ve yollar  
Yağmursuyu hattı  
Kanalizasyon hattı  
Tesisat galerileri  
İçme suyu hattı  
Çevre aydınlatma  
Yangın hattı, imalatları yapılacaktır.

Parsel tesviye işi ve yol kazıları %95 oranında tamamlanmıştır.

Yağmur Suyu hatları %70 oranında tamamlanmıştır.

Kanalizasyon hatları imalatları sene içerisinde başlanacak olup diğer imalatlara henüz başlanmamıştır.





Mimar Sinan Kampüsü 2014 Yılından Uydu Görüntüsü





Mimar Sinan Kampüsü 2016 Yılından Uydu Görüntüsü

### 3- Derslik ve Merkezi Birimler

Proje No : 2011H037130

Proje Tutarı : 71.552.000,00 TL

PROJE BEDELİ	GEÇEN YILLAR HARCAMASI, TL	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL	Son Dönemdeki Harcamalar , TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR.%	FİZİKİ GER.%	
71.552.000,00	28.447.199,32	1.000.000,00	14.750,00	%40	%40	Yıl içerisinde ihale hazırlıkları devam etmektedir

## 4- Muhtelif İşler


Proje No : 2012H032290  
Proje Tutarı : 222.000.000,00 TL

PROJE BEDELİ	GEÇEN YILLAR HARCAMASI, TL	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR.%	FİZİKİ GER.%	
222.000.000,00	156.097.257,60	33.942.000,00	23.075.629,59	%81	%81	"Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü 1Etap 2. Kısım Tadilat ve Onarım İşinin Haziran ayı içerisinde tamamlanmıştır.

## Muhtelif İşler

A-Sümer kampüsü 1. Etap 2. Kısım Tadilat ve Onarım İşİ kapsamında Mamul Ambarı, Giriş yapıları, İtfaiye ve Büro binası restorasyonu ile Ana Fabrika binasının güçlendirme imalatları tamamlanmıştır.

- Mamul Ambarı tamamlanmıştır.
- Altyapı İnşaatı İşİ tamamlanmıştır.
- Giriş yapıları inşaatı 16.06.2016 tarihli Rektörlük kararıyla %7 seviyesinde durdurulmuştur.
- İtfaiye ve Büro binası restorasyonu kısmı tamamlanmıştır,

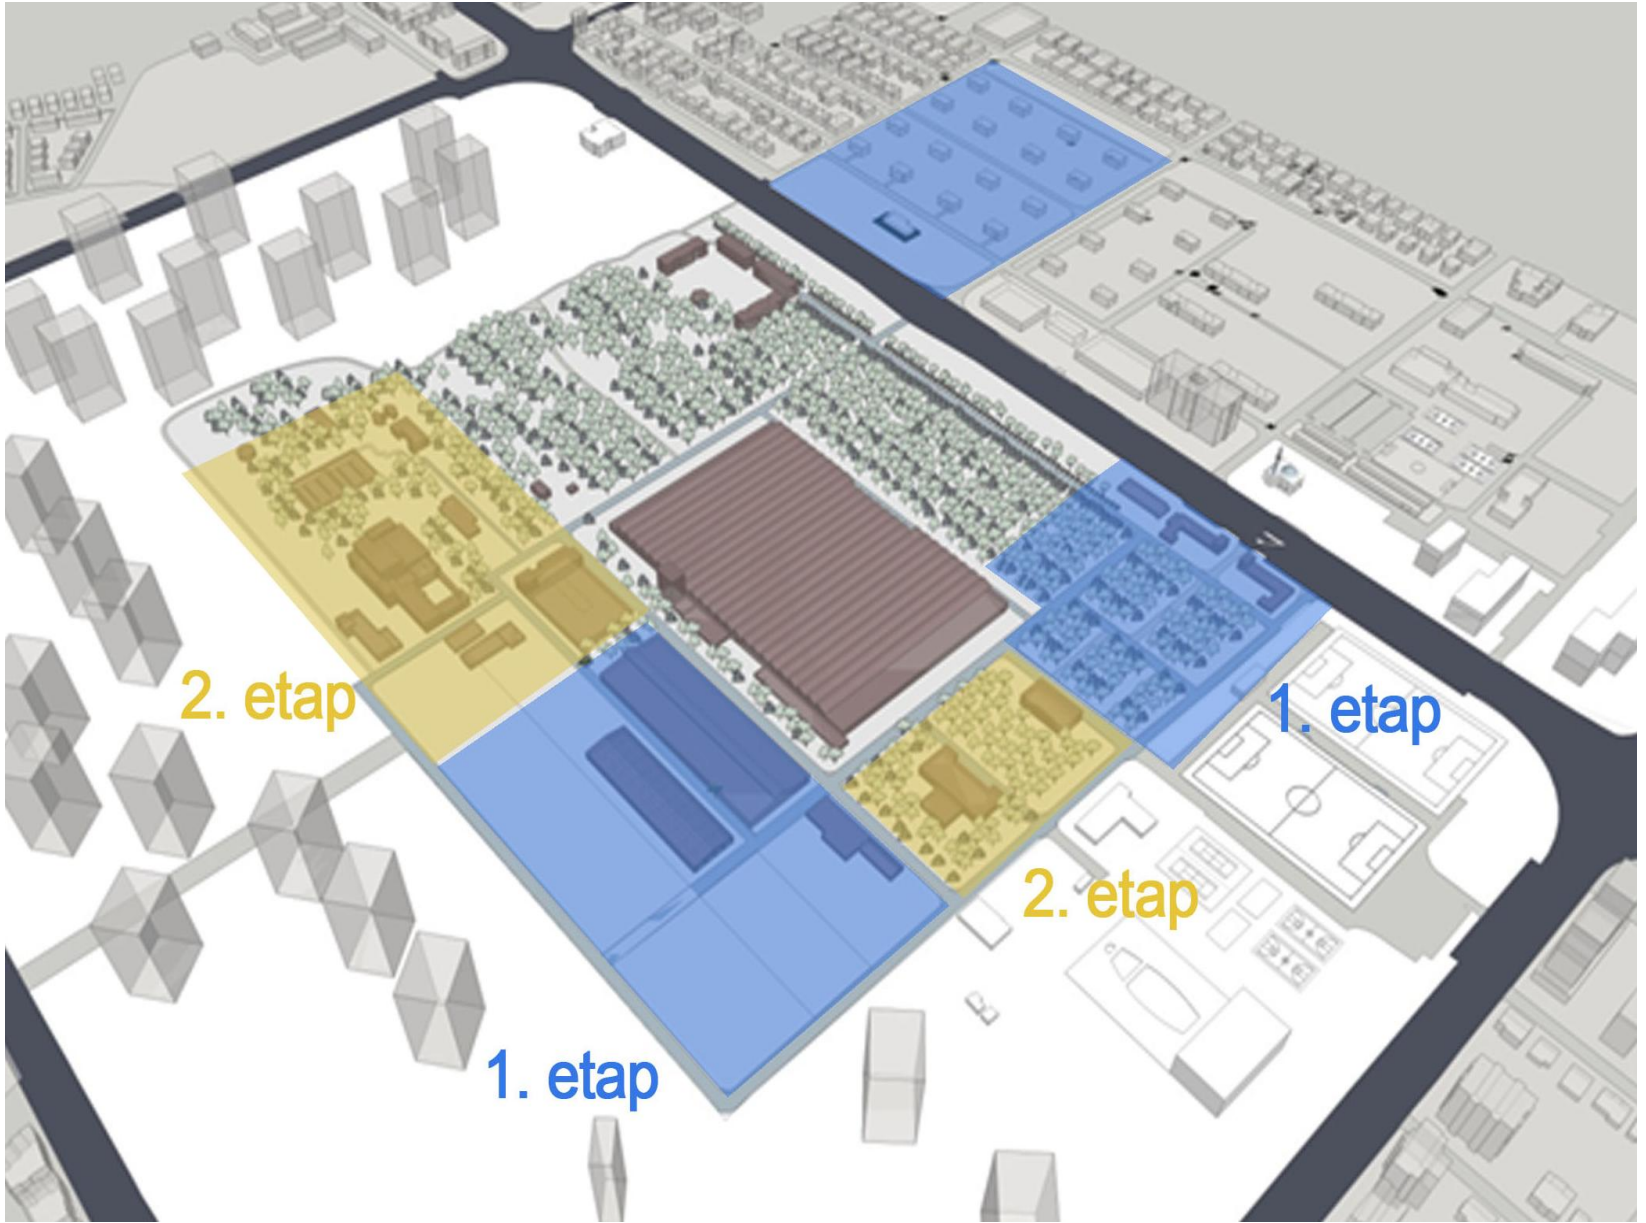

2. etap

1. etap

2. etap

1. etap

Sümer Yerleşkesi





Mamul Ambarı ve İtfaiye Binası Eski Hali





Mamul Ambarı ve İtfaiye Binası İnşaatı Şimdiki Hali



## 5- Açık Kapalı Spor Tesisleri

Proje No : 2014H050010

Proje Tutarı : 2.000,00 TL

PROJE BEDELİ	GEÇEN YILLAR HARCAMASI, TL	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR.%	FİZİKİ GER.%	
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri proje çalışmaları devam etmektedir

## 6- Yayın Alımı

Proje No : 2017H32050

Proje Tutarı : 1.505.000,00 TL

PROJE BEDELİ	GEÇEN YILLAR HARCAMASI , TL	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL	Son Dönemdeki Harcamalar , TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR. %	FİZİKİ GER.%	
1.000.000,00	0,00	1.505.000,00	825.983,90	%55	%55	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından basılı ve dijital yayın alımı devam etmektedir.

## 7- Yükseköğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Sistem ve Süreç Tasarımı

Proje No : 2016H035230

Proje Tutarı : 4.000.000,00 TL

PROJE BEDELİ, TL	GEÇEN YILLAR HARCAMASI, TL	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR. %	FİZİKİ GER. %	
4.000.000,00	941.640,00	1.025.000,00	513.300,00	%37	%36	3. Nesil Devlet Üniversitesi Modelinin gerçekleştirilmesi ile ilgili Etüt Proje ve Müşavirlik çalışmaları devam etmektedir

## 8- Merkezi Arařtırma Laboratuvarı

Proje No : 2014K120110

Proje Tutarı : 14.518.000,00 TL

PROJE BEDELİ	GEÇEN YILLAR HARCAMASI, TL	PROGRAM YILI ÖDENEĐİ, TL	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR. %	FİZİKİ GER.%	
14.518.000,00	4.045.447,00	3.314.000,00	315.528,98	0,57%	0,13%	Eđitim ve arařtırma laboratuvarların geliştirilmesi çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu kapsamda Laboratuvar cihaz ve ekipmanları temin edilmektedir
