



ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

AGÜ 2018 YILI 1. DÖNEM YATIRIM RAPORU

YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU

1- TOPLANTI DÖNEMİ	: 2018 Yılı 1. Dönem
2- YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	: ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
3- TOPLAM PROJE SAYISI	: 8 Adet
4- PROJELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI	
Eğitim-Yükseköğretim Sektörü	: 6 Adet
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü	: 1 Adet
Eğitim-Kültür Sektörü	: -
DHK-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü	: 1 Adet
5- TOPLAM PROJE TUTARI	: 395.872.000,00 TL
6- ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 219.856.585,84 TL
7- YIL ÖDENEĞİ TOPLAM	: 99.917.000,00 TL
8- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 63.061.715,42 TL
9- PARASAL GERÇEKLEŞME	: % 71
10- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 60
11- BİTEN PROJE SAYISI	: 2
12- DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 5 Adet
13- İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: -
14- BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: 1
15- BAŞLANMAMA NEDENLERİ	: Diğer projelerin daha öncelikli olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
16- ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR	: -
17- SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ	: -
18- ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	: -

Üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım Bütçesi


Proje Adı	Yıl Ödeneği, TL
1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje İşleri	500.000,00
2-Kampüs Altyapısı	32.998.000,00
3-Derslik ve Merkezi Birimler	-
4-Merkezi Araştırma Laboratuvarı	3.314.000,00
5-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000,00
6-Muhtelif İşler	59.053.000,00
7- Yayın Alımı	1.625.000,00
8-Yükseköğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Sistem ve Süreç Tasarımı	2.425.000,00
Toplam	99.917.000,00

1-Çeşitli Ünitelerin Etüt-Proje İşleri

Proje No : 2017H032040

Proje Tutarı : 500.000,00 TL

PROJE BEDELİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL (Revize Dahil)	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
			NAKİT HAR.%	FİZİKİ GER.%	
500.000,00	500.000,00	162.250,00	%32	%32	Üniversitemize ait yapılması planlanan eğitim ve hizmet binaları ile diğer yapı işlerine ait projelerin hazırlanması çalışması devam etmektedir.

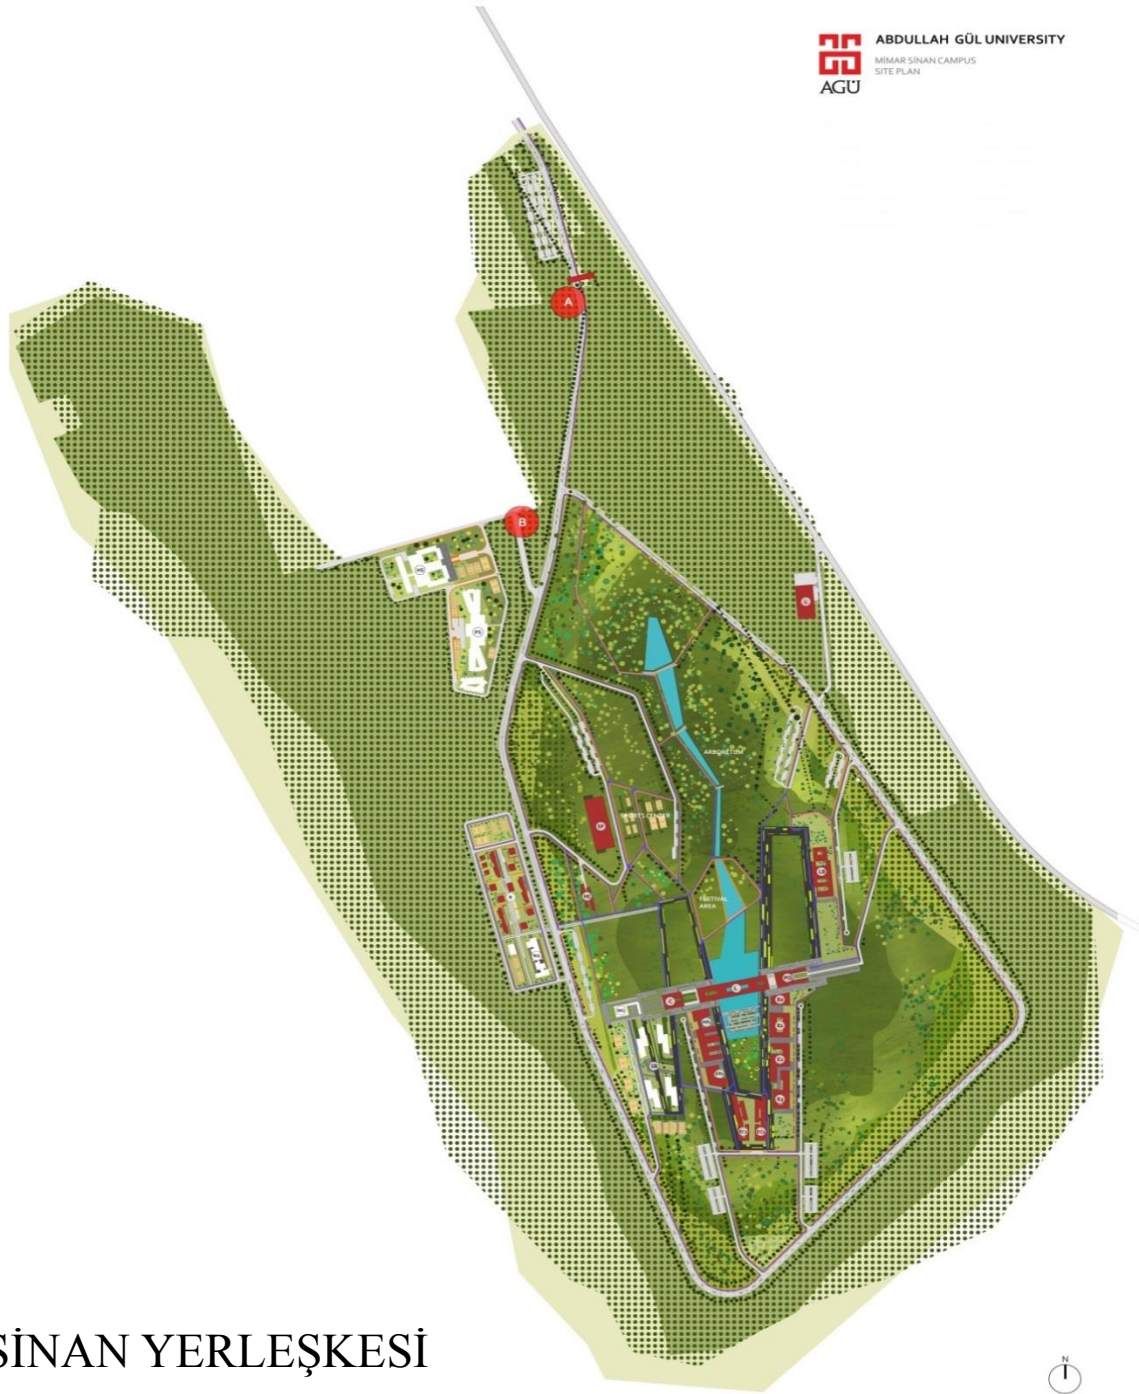

MİMAR SİNAN YERLEŞKESİ



2- Kampüs Altyapısı

Proje No : 2011H037140

Proje Tutarı : 82.300.000,00 TL

PROJE BEDELİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL (Revize Dahil)	GEÇEN YILLAR HARCAMAS I, TL	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR. %	FİZİKİ GER.%	
82.300.000,00	32.998.000,00	30.325.041,92	33.025.959,45	%220	%60	Mimar Sinan Yerleşkesi Altyapı Tesisleri İnşaatı Yapım İşi devam etmektedir.

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesinde altyapı inşaatı devam etmektedir. 2018 sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında;
Parsel tesviye işleri ve yollar
Yağmursuyu hattı
Kanalizasyon hattı
Tesisat galerileri
İçme suyu hattı
Çevre aydınlatma
Yangın hattı, imalatları yapılacaktır.

Parsel tesviye işi ve yol kazıları %95 oranında tamamlanmıştır.
Yağmur Suyu hatları %80 oranında tamamlanmıştır.
Diğer imalatlara henüz başlanmamıştır.



Mimar Sinan Kampüsü 2014 Yılından Uydu Görüntüsü



Mimar Sinan Kampüsü 2016 Yılından Uydu Görüntüsü

3- Derslik ve Merkezi Birimler

Proje No : 2011H037130

Proje Tutarı : 71.552.000,00 TL

PROJE BEDELİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL (Revize Dahil)	GEÇEN YILLAR HARCAMASI, TL	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR.%	FİZİKİ GER.%	
71.552.000,00	0,00	28.447.199,32	14.750,00	%1,48	%39,78	Yıl içerisinde ihale hazırlıkları devam etmektedir

4- Muhtelif İşler

Proje No : 2012H032290

Proje Tutarı : 222.000.000,00 TL


PROJE BEDELİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL (Revize Dahil)	GEÇEN YILLAR HARCAMASI, TL	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR.%	FİZİKİ GER.%	
222.000.000,00	59.053.000,00	156.097.257,6	25.942.748,88	%129	%80	Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü 2. Etap 1. Kısım Onarım İşİ Kapsamında Ana Fabrika Binası Restorasyonu Ve Ek Binasının Yapım İşİ çalışmalarını kapsamında 21.11.2017 tarihinde ihale yapılmış olup 05.12.2017 tarihinde yer teslim işlemleri gerçekleştirilmiştir

Muhtelif İşler

A-Sümer kampüsü 1. Etap 2. Kısım Tadilat ve Onarım İşİ kapsamında Mamul Ambarı, Giriş yapıları, İtfaiye ve Büro binası restorasyonu ile Ana Fabrika binasının güçlendirme imalatları tamamlanmıştır.

Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü 2. Etap 1. Kısım Onarım İşİ Kapsamında Ana Fabrika Binası Restorasyonu Ve Ek Binasının Yapım İşİ çalışmaları kapsamında 21.11.2017 tarihinde ihale yapılmış olup 05.12.2017 tarihinde yer teslim işlemi gerçekleştirilmiştir

- Mamul Ambarı tamamlanmıştır.
- Altyapı İnşaatı İşİ tamamlanmıştır.
- Giriş yapıları inşaatı 16.06.2016 tarihli Rektörlük kararıyla %7 seviyesinde durdurulmuştur.
- İtfaiye ve Büro binası restorasyonu kısmı tamamlanmıştır,

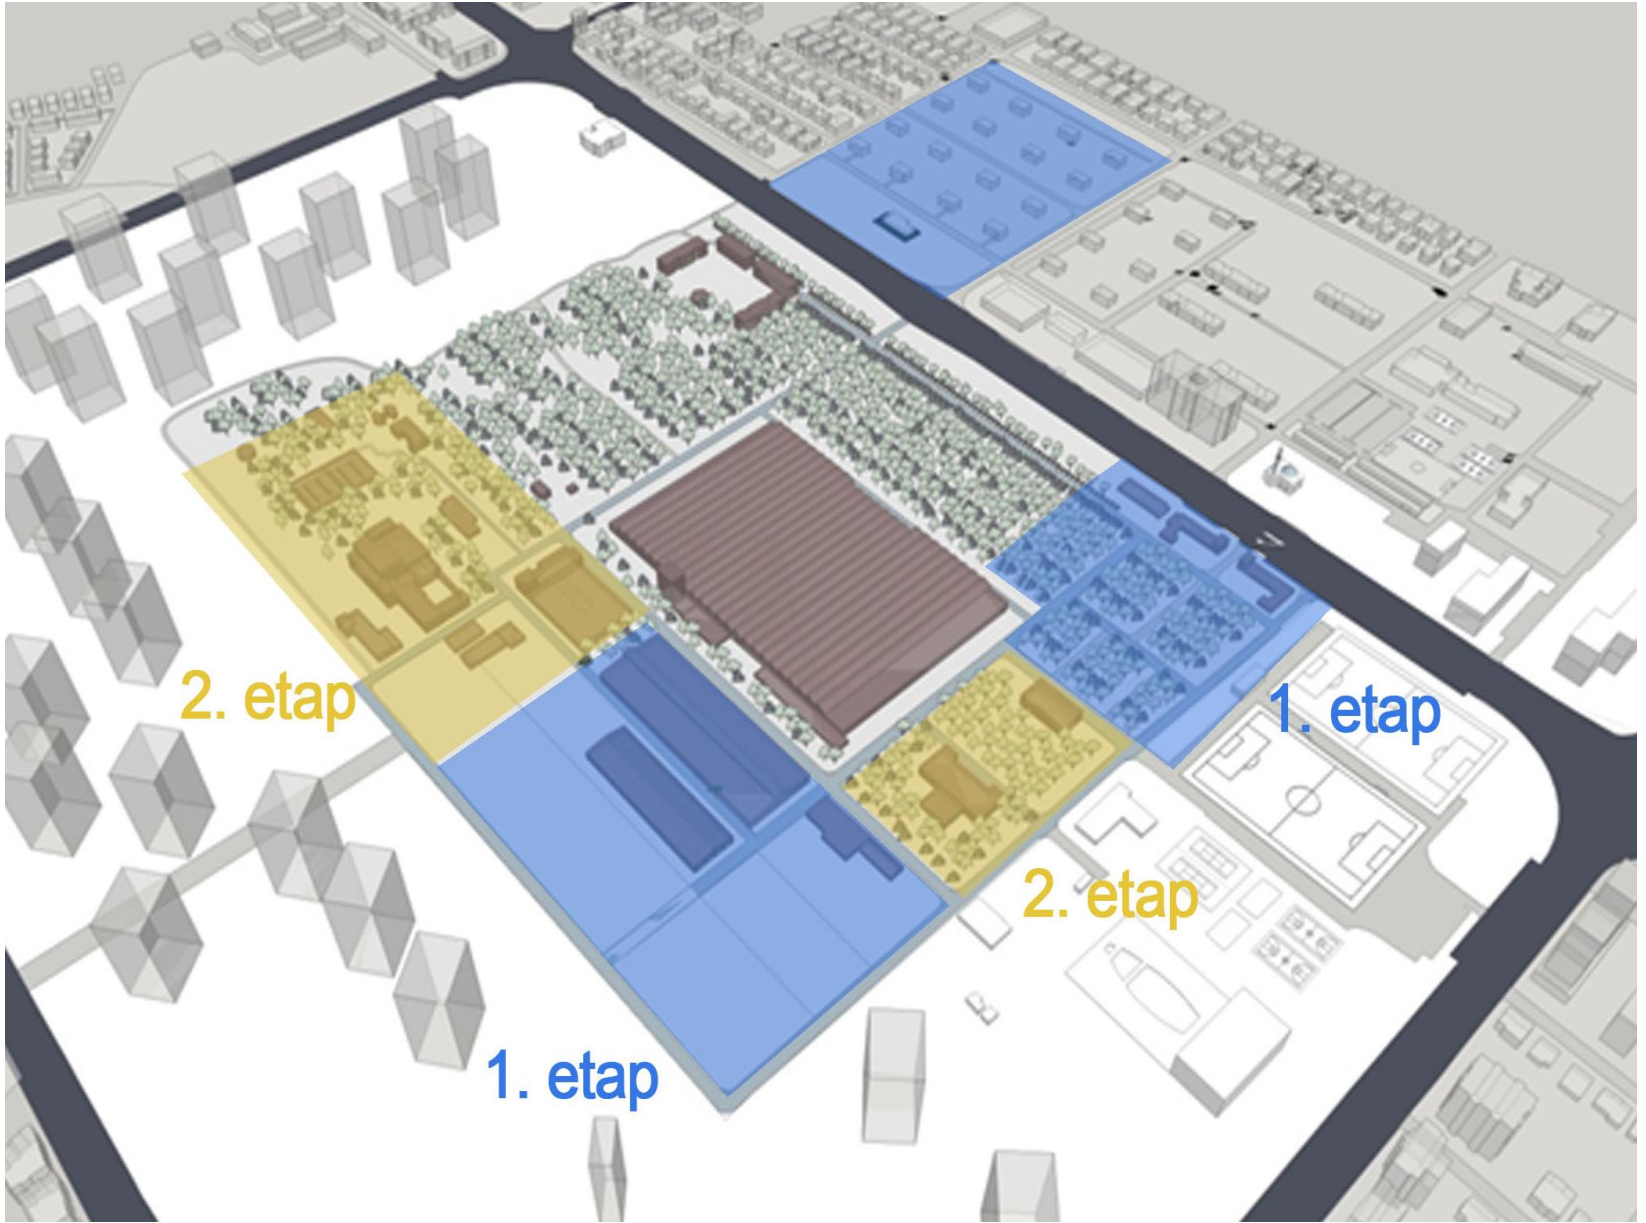

Sümer Yerleşkesi



Mamul Ambarı ve İtfaiye Binası Eski Hali



Mamul Ambarı ve İtfaiye Binası İnşaatı Şimdiki Hali

5- Açık Kapalı Spor Tesisleri

Proje No : 2014H050010

Proje Tutarı : 2.000,00 TL

PROJE BEDELİ	GEÇEN YILLAR HARCAMASI, TL	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR.%	FİZİKİ GER.%	
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri proje çalışmaları devam etmektedir

6- Yayın Alımı

Proje No : 2017H32050

Proje Tutarı : 1.505.000,00 TL

PROJE BEDELİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL (Revize Dahil)	GEÇEN YILLAR HARCAMASI, TL	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR.%	FİZİKİ GER. %	
1.000.000,00	1.625.000,00	-	1.598.608,11	%159,86	%0,00	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından basılı ve dijital yayın alımı 2017 yılında tamamlanmıştır.

7- Yükseköğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Sistem ve Süreç Tasarımı

Proje No : 2016H035230

Proje Tutarı : 4.000.000,00 TL

PROJE BEDELİ, TL	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ, TL (Revize Dahil)	GEÇEN YILLAR HARCAMASI, TL	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR.%	FİZİKİ GER.%	
4.000.000,00	2.425.000,00	941.640,00	2.001.870,00	%200,19	%0,00	3. Nesil Devlet Üniversitesi Modelinin gerçekleştirilmesi ile ilgili Etüt Proje ve Müşavirlik çalışmaları devam etmektedir

8- Merkezi Arařtırma Laboratuvarı

Proje No : 2014K120110

Proje Tutarı : 14.518.000,00 TL

PROJE BEDELİ	GEÇEN YILLAR HARCAMASI, TL	PROGRAM YILI ÖDENEĐİ, TL	Son Dönemdeki Harcamalar, TL	DÖNEM SONUNA KADAR		AÇIKLAMA
				NAKİT HAR.%	FİZİKİ GER.%	
14.518.000,00	4.045.447,00	3.314.000,00	315.528,98	100,49%	0,13%	Eđitim ve arařtırma laboratuvarların geliştirilmesi çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu kapsamda Laboratuvar cihaz ve ekipmanları temin edilmektedir

TEŐEKKÜRLER
